

Inspecta

PASŪTĪTĀJS: SIA „Talsu Bio-enerģija”
IZPILDĪTĀJS: AS „Inspecta Latvia”

Projekta nosaukums: „Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā”

Līguma nr. 3-3.2/016/2015 no 13.02.2015 (iepirkuma ID Nr. TBE 04/2014)

Projekta identifikācija Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/040

PROGRESA ZINOJUMS

2015. gada maijs, jūnijs

Talsos, 2015

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

Kontaktinformācija
Tālr.: +371 67 607 900
Fakss: +371 67 607 901
e-pasts: info@inspecta.lv

Centrālais Birojs: Rīga, Latvija
PVN reģ. Nr.: LV40003130421

PROGRESA ZINOJUMS

SATURS

1. Vispārējā situācija	2
1.1. Vispārēja informācija par līgumiem	2
1.2. Galvenie notikumi atskaites periodā	3
2. Projekta laika grafika stāvoklis	3
3. Problemas projekta realizācijā	3
4. Priekšlikumi par laika grafika korekciju un problēmu atrisināšanu	3
5. Saņemtie dokumenti no Pasūtītāja, atbildes, strīdus, pretenzijas	3
6. Vide, darba drošība, negadījumi	3
7. Pārbaudes, inspekcijas, ražotāja apmeklējumi	3
8. Nodošana, testi	4
9. Konstatētās atkāpes un norādījumi būvuzņēmējam	4
10. Projekta resursi un projekta izmakas	5
11. PIELIKUMI (Fotofiksācija)	5

1. VISPĀRĒJĀ SITUĀCIJA.

1.1 Vispārēja informācija par līgumiem.

Visi līgumi slēgti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/040 „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Līgums par tiesībām veikt būvuzraudzību iepirkumā „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta "Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā, Nr. 3-3.2/016/2015, starp SIA „Talsu Bio-enerģija” un AS „Inspecta Latvia” noslēgts 2015. gada 13. februārī. Līguma summa EUR 22 017,03 neieskaitot PVN. Līguma termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz visu tā nosacījumu pilnīgai izpildei – būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

Šī projekta ietvaros būvdarbus PASŪTĪTĀJA (SIA „Talsu Bio-enerģija”) uzdevumā, pamatojoties uz 2014. gada 22. decembra līgumu Nr. 2014/1 veic SIA „Grobiņas SPMK”, reg. Nr.42103005771, M. Namiķa iela 19A, Grobiņa LV-3430. Līguma summa EUR 611153,08 neieskaitot PVN.

Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 2015. gada 15. jūlijs.

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši SIA "CO Sistēmas" (reg. Nr. 40003397115) izstrādātam tehniskajam projektam „Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā”.

1.2 Galvenie notikumi atskaites periodā.

- 1) Projekta atskaites periodā ir notikušas sešas būvniecības dalībnieku sapulces.
- 2) Turpinājās un tika pabeigtī rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbi Dundagas – Darba ielu rajonā.
- 3) Turpinājās un tika pabeigtī rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbi Lielās – Akmeņu ielu rajonā.
- 4) Turpinājās un tika pabeigtī darbi Brīvības – Pumpura ielu rajonā.
- 5) Visos darbu posmos tika pabeigtī labiekārtošanas darbi.
- 6) Tika sagatavota izpilddokumentācija un 30.06.2015. iesniegta būvvaldē izskatīšanai.
- 7) 2015. gada 6. jūlijā būvvaldes komisija parakstīja aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

2. PROJEKTA LAIKA GRAFIKA STĀVOKLIS.

Būvdarbi veikti atbilstoši būvuzņēmēja iesniegtam precizētam darbu izpildes laika grafikam.

3. PROBLĒMAS PROJEKTA REALIZĀCIJĀ.

Problēmas sagādāja topogrāfiskajos plānos neprecīzi norādītais inženierkomunikāciju izvietojums, kā rezultātā bija nepieciešams autoruzraudzības kārtībā ieviest būvprojekta izmaiņas.

4. PRIEKŠLIKUMI PAR LAIKA GRAFIKA KOREKCIJU UN PROBLĒMU ATRISINĀŠANU.

Būvuzņēmējam tiek ieteikts savlaicīgi pieprasīt atzinumus no tehnisko noteikumu izsniedzēju institūcijām, kā arī savlaicīgi sagatavot gala izpilddokumentāciju.

5. SANEMTIE DOKUMENTI NO PASŪTĪTĀJA, ATBILDES, STRĪDUS, PRETENZIJAS

Strīdus un līgumiskas pretenzijas nav.

6. VIDE, DARBA DROŠĪBA, NEGADĪJUMI

Atskaites periodā nav notikuši negadījumi. Būvuzņēmējam tika doti norādījumi sekot tranšeju norobežojošo lenšu stāvoklim un nepieciešamības gadījumā tās atjaunot.

Tāpat tika doti norādījumi rūpīgi attīrīt tranšejas no cauruļu siltumizolācijas paliekām.

7. PĀRBAUDES, INSPEKCIJAS, RAŽOTĀJA APMEKLĒJUMI.

Tika pārbaudīti piegādāto materiālu atbilstību apliecinošie dokumenti. Veiktas metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes ar vizuālo un radiogrāfijas metodēm.

8. NODOŠANA, TESTI.

Atskaites periodā veikti izbūvēto siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes testi. Veiktas savienojumu uzmavu blīvuma pārbaudes, kā arī grunts sablīvējuma testi pirms asfalta seguma ieklāšanas.

9. KONSTATĒTĀS ATKĀPES UN AIZRĀDĪJUMI BŪVUZNĒMĒJAM

Tehniskās uzraudzības laikā konstatētas sekojošas atkāpes būvdarbu tehnoloģijas, par ko būvuzņēmējam tika izteikti aizrādījumi:

- 1) Jānodrošina tranšeju tīrība no iebrukušiem akmeņiem;
- 2) Nav ievēroti minimālie attālumi starp cauruļvadiem;
- 3) Vairākiem metinātiem savienojumiem konstatēta neatbilstība vizuālās testēšanas kvalitātes prasībām;
- 4) Caurulēm konstatēti montāžas laikā radīti mehāniski bojājumi;
- 5) Asfalta seguma atjaunošanas darbu kvalitāti.

Pielikumā: Fotofiksācija

10. PROJEKTA RESURSI UN PROJEKTA IZMAKSAS.

Līgums 3-3.2/016/2015 ar AS „Inspecta Latvia”

Līguma summa, EUR bez PVN	22 017,03
Izmaiņas	nav

Līgums Nr. Nr. 2014/1 ar SIA „Grobiņas SPMK”

Līguma summa par būvdarbiem, EUR bez PVN	611153,08
Izmaiņas (saskaņā ar vienošanās par būvdarbu apjoma izmaiņām 17.06.2015.)	ir
Līguma summa par būvdarbiem pēc izmaiņām, EUR bez PVN	591659,13

AS „Inspecta Latvia”

Būvuzraugs:  /A. Basajs/

2015. gada 7. jūlijs

Siltumtīklu izbūves darbu fotofiksācija posmā Celtnieku ielas rajonā:



1.att. Atjaunots asfalta segums



2.att. Atjaunots asfalta segums

Siltumtīklu izbūves darbu fotofiksācija Darba ielas rajonā:



3.att. Samontētas rūpnieciski izolētās caurules



4.att. Veiktie labiekārtošanas darbi I posms



5.att. Asfalta seguma atjaunošana II posms



6.att. Asfalta seguma atjaunošana II posms

Siltumtīklu izbūves darbu fotofiksācija Lielās - Akmeņu ielu rajonā:




7.att. Rūpnieciski liekto cauruļu montāža



8.att. Rūpnieciski liekto cauruļu montāža



9.att. Rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāža

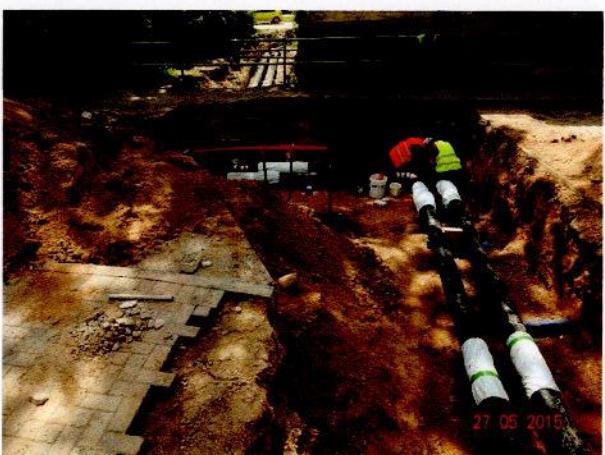


10.att. Rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāža



11.att. Veiktie labiekārtošanas darbi



12.att. Veiktie labiekārtošanas darbi

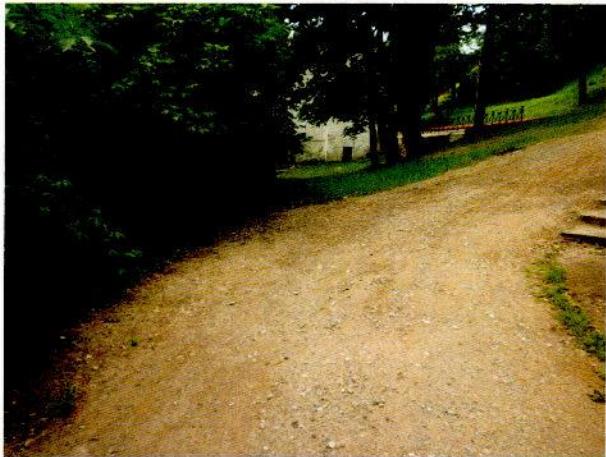

13.att. Veiktie labiekārtošanas darbi



14.att. Atjaunots asfalta segums

Siltumtīklu izbūves darbu fotofiksācija Brīvības - Pumpura ielu rajonā:



15.att. Tranšejas atrakšana, smilts pamatnes sagatavošana



16.att. Rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāža



17.att. Rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāža




18.att. Tranšejas aizbēršana

Inspecta



19.att. Veiktie labiekārtošanas darbi

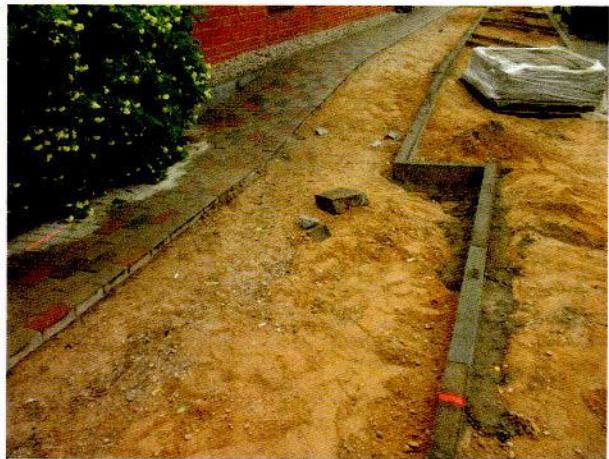

20.att. Bortakmeņu atjaunošana
